


EMPRESA: _____ Nº ORÇAMENTO: _____
 NOME DA OBRA: _____

As distâncias devem ser medidas na obra ou baseadas em planta. Devem ser consideradas medidas efetivas, ou seja, devem refletir o mesmo caminho que será percorrido pelo condutor, e não em linha reta. Devem ser considerados desvios, curvas, espessuras de laje e folgas para manuseio.

O valor da fiação varia de acordo com o número de paradas e altura de pé direito, os orçamentos padrões são estipulados para chamadas, limites, trincos, ipd com a medida de pé direito padrão de até 3,5m.

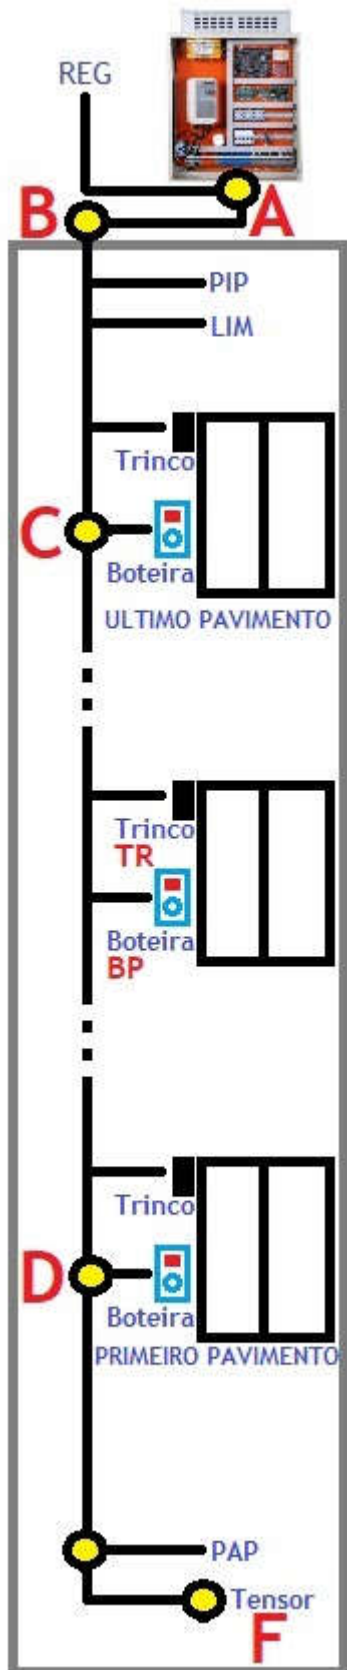


Quantidade de Paradas:		Velocidade do carro:	
Denominação dos andares			
Seleção de Chamada:	<input type="radio"/> Subida e Descida	<input type="radio"/> Descida	<input type="radio"/> Manda e chama
Se for subida e descida, quais os andares com dois botões			
Se for manda e chama possui botão de emergência:			
Porta pavimento:	<input type="radio"/> Eixo Vertical	<input type="radio"/> Manual	<input type="radio"/> Simultânea
Se for Manual, possui trava elétrica nas portas:			
Se for 2 operadores de porta informar	Porta 1 abre nos andares:	Porta 2 abre nos andares:	

L1	(A B) Distância entre o quadro de comando até o ponto de entrada da fiação de poço		m
UA	(B C) Distância entre o ponto de entrada da fiação no poço a boteira do pavimento superior		m
FP	(D PAP) Distância entre a boteira do primeiro pavimento e a caixa de fundo de poço (PAP)		m
PT	(D F) Distância da polia tensora (se existir) até a boteira inferior		m
TR	Distância do trinco da porta até a calha da fiação		m
BP	Distância entre a boteira de pavimento e a calha de fiação (quando for 2 op. de Porta informar a maior distância)		m
LIM	Distância entre os limites e a calha da fiação		m
REG	(A REG) Distância entre o regulador de velocidade e o quadro de comando		m
PIP	Distância da porta de inspeção (se existir) até á calha da fiaçã		m

Altura (Pé direito) de cada andar (Distância de Soleira á Soleira)

	metros	metros	metros
1	11	21	
2	12	22	
3	13	23	
4	14	24	
5	15	25	
6	16	26	
7	17	27	
8	18	28	
9	19	29	
10	20	30	



Localização dos IPD de pavimento:

- Acima da Porta
- Junto a boteira

Favor enviar esta ficha em até 5 dias para não ocorrer atraso na entrega do material
